


Spital Dornach

Erweiterung Büro's

Wochenbulletin KW 22_2020

normaler Baustellenbetrieb
 Lärmintensiver Baustellenbetrieb
 Baustellenbetrieb am Bestand (Staub und Lärm)

gering
 mittel
 hoch

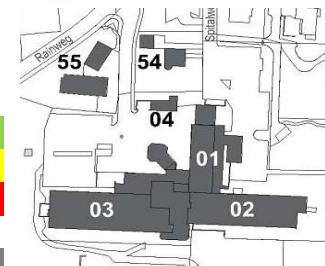

Staubbelastung aussen im Baustellenbereich
 (Fenster gegen Baustellenbereich, Montag bis Freitag, 7.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 geschlossen halten)



Was	Wo	Bereich	Aktion	Dauer	Wann		Wer
Woche 22 (25. 05. - 29. 05. 2020)							
diverse	Dach	04 Module	Innenausbau der Module (Maler, Bodenbelag, Schreiner)	Mo - Do	gT	gering	Stamm Bau AG
diverse	Dach	04 Module	Innenausbau der Module (Elektrisch)	Mo - Mi	gT	gering	Stamm Bau AG
Elektro	Dach	04 Module	Schwachstrominstallationen	Mo - Mi	gT	gering	Elektro Huber
Elektro	Dach	04 Module	Starkstrominstallationen	Mo - Mi	gT	gering	Etavis
Dachdecker	Dach	Anbau	Dachrandabdeckung	Mo - Fr	gT	gering	Wohlgemuth Dach AG
Dachdecker	Dach	Anbau	Blitzschutz	Mo - Fr	gT	gering	Wohlgemuth Dach AG
Spital Dornach	Dach	04 Module	Baureinigung	Mo ... Fr	gT	gering	DO Hauswirtschaft
Schliessanlage	Dach	04 Module	Türgriffe und Schliesszylinder	Do - Fr	gT	gering	Kehlhofer
Ausblick auf Woche 23 (01. 06. - 05. 06. 2020)							
Spital Dornach	Dach	04 Module	Baureinigung	Di ... Fr	gT	gering	DO Hauswirtschaft
Aufzüge	Dach	04 Module	Treppenlift montieren	Di	gT	gering	Meier + Co
Spital Dornach	Dach	04 Module	Umzug	Di - Fr	gT	gering	DO tech. Dienst

Erweiterung Büro's

Fotos (Rückblick auf letzte Woche)

