


Spital Dornach

Erweiterung Büro's

Wochenbulletin KW 23_2020

normaler Baustellenbetrieb
 Lärmintensiver Baustellenbetrieb
 Baustellenbetrieb am Bestand (Staub und Lärm)

gering
 mittel
 hoch

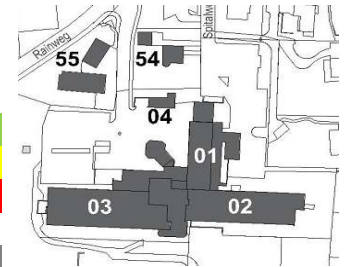

Staubbelastung aussen im Baustellenbereich
 (Fenster gegen Baustellenbereich, Montag bis Freitag, 7.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 geschlossen halten)



Was	Wo	Bereich	Aktion	Dauer	Wann		Wer
Woche 23 (01. 06. - 05. 06. 2020)							
Sanitär	Dach	04 Module	Dachwasserleitungen fertig montieren	Di ... Fr	gT	gering	Kalbermatten
Sanitär	Dach	04 Module	Rückbau Corona-Lavabo	Di ... Fr	gT	gering	Kalbermatten
diverses	Dach	04 Module	Mängelbehebung	Di ... Fr	gT	gering	Stamm Bau AG
Aufzüge	Dach	04 Module	Treppenlift montieren	Mi	gT	gering	Meier + Co
Spital Dornach	Dach	04 Module	Baureinigung	Do ... Fr	gT	gering	DO Hauswirtschaft
Ausblick auf Woche 24 (08. 06. - 12. 06. 2020)							
Spital Dornach	Dach	04 Module	Baureinigung	Mo ... Fr	gT	gering	DO Hauswirtschaft
Schliessanlage	Dach	04 Module	Türgriffe und Schliesszylinder	Fr	gT	gering	Kehlhofer
Spital Dornach	Dach	04 Module	Umzug		gT	gering	DO tech. Dienst

Erweiterung Büro's

Fotos (Rückblick auf letzte Woche)

